

湖北华丹医药科技股份有限公司 关于环境问题停产整改方案

湖北华丹医药科技股份有限公司



湖北华丹医药科技股份有限公司 关于环境问题停产整改方案

荆门市生态环境局钟祥分局：

2022年4月29日，我公司收到贵单位荆（钟）环责改字【2022】27号《责令改正违法行为决定书》，根据《责令改正违法行为决定书》的要求，我公司积极采取有效措施进行整改，立即停止使用水泵软管抽取二沉池的污水至总排放口的行为。并下达了《责令停产整治决定书》荆（钟）环责停决字【2022】1号，责令本公司停产整改。公司于2022年4月30日开始了污水处理站停产整改工作，成立了整改领导小组、制定了整改方案、明确了整改责任人，要求相关部门立即开展整改工作，具体如下：

一、整改领导小组

事件发生后，我公司成立了以总经理贺才勇为组长的整改专班，对管理制度、设备维护、运行台账进行了自查，举一反三，追根溯源制定整改清单，逐项整改。

组长：贺才勇

副组长：鲁志云

组 员： 关意洪 程 捷 蔡明新 易 健 张澄宇 李兴家

二、整改方案

1. 将二沉池的污水水泵软管抽取直接放到排放口。

整改措施：立即停止使用水泵软管抽取二沉池的污水至总排放口的行为，规范应急处理措施，遇到极端天气启动事故应急池，



预防污染源外泄。

整改责任人：李兴家

整改时间：2022年4月27日

整改资金：2000元

2. 污水处理站污水处理设施未正常运行。压滤机、加药系统、气浮池维护不到位，设备老化。

整改措施：委托有资质的第三方单位进行设计、施工。具体措施如下：

(1) 废水分流系统改造。高浓度废水单独收集经过预处理后与低浓度废水一并进入综合废水调节池。预处理系统采用fenton氧化工艺，更换氧化塔。

(2) 完善高浓度废水预处理系统改造。配置ph仪控制加酸，ORP控制双氧水投加和氧化反应。新增加配药溶药桶规格为2立方米，材质为PP材质；均配置自动搅拌装置。

(3) 污泥回流、混合液回流系统改造。改造现有排泥管道，实现各个生化处理单元独立排泥，独立污泥回流。中和反应沉淀池污泥及时排放至污泥暂存池通过板框压滤机进行压滤脱水。板框压滤机增设基础，抬高板框机的高程，同时在板框机附近新增一座滤液暂存池，采用潜污泵回流至系统前端综合调节池进一步对滤液进行处理。



(4) 气浮机修复改造。修复现有的气浮机。用于应对运行过程中出水总磷不稳定的情况，进一步去除 SS，以及总磷，以确保出水总磷通过加药处理能够达标排放。

整改责任人：张澄宇、易健

整改时间：2022年6月8日-2022年9月30日

整改资金：120万元

3. 在线监测系统未投入运行。

整改措施：公司已于2022年4月19日开始污水在线监测系统安装，目前，由于污水处理站改造升级，无污水外排，在线监测系统设备无法调试，待污水处理站升级改造完成后进行验收合格再正式投入使用。

整改责任人：贺才勇

整改时间：2022年4月19日-2022年10月30日

整改资金：15万元

湖北华丹医药科技股份有限公司

2022年7月1日



湖北华丹医药科技股份有限公司 关于环境问题停产整改完成情况

2022年4月29日,我公司收到贵单位荆(钟)环责改字【2022】27号《责令改正违法行为决定书》,根据《责令改正违法行为决定书》的要求,并下达了《责令停产整治决定书》荆(钟)环责停决字【2022】1号,责令本公司停产整改。公司于2022年4月30日开始了污水处理站停产整改工作,具体如下:

1、将二沉池的污水水泵软管抽取直接放到排放口。

整改完成情况:立即停止使用污水水泵软管抽取污水直接放到排放口的违章行为。

2、污水处理站污水处理设施未正常运行。压滤机、加药系统、气浮池维护不到位,设备老化。

整改完成情况:(1)停产后已对A/O、高低负荷污水池进行了改造,增加了爆气管、盘,加挂填料。(2)增加污水回流系统提升泵。(3)对污泥压滤系统进行了改造,增加了滤液暂存池。(4)目前,正在进行加药系统和氧化系统改造,预计2022年8月底前完成。污水处理站改造升级全部施工、调试预计在10月底前完成,届时委托第三方机构进行检测验收。

3、在线监测系统未投入运行。




整改完成情况：目前，在线监测系统设备已安装完成，待污水处理站改造验收合格后，联网投入使用。

整改佐证图片资料



一、污水处理系统改造


1、污水池改造情况

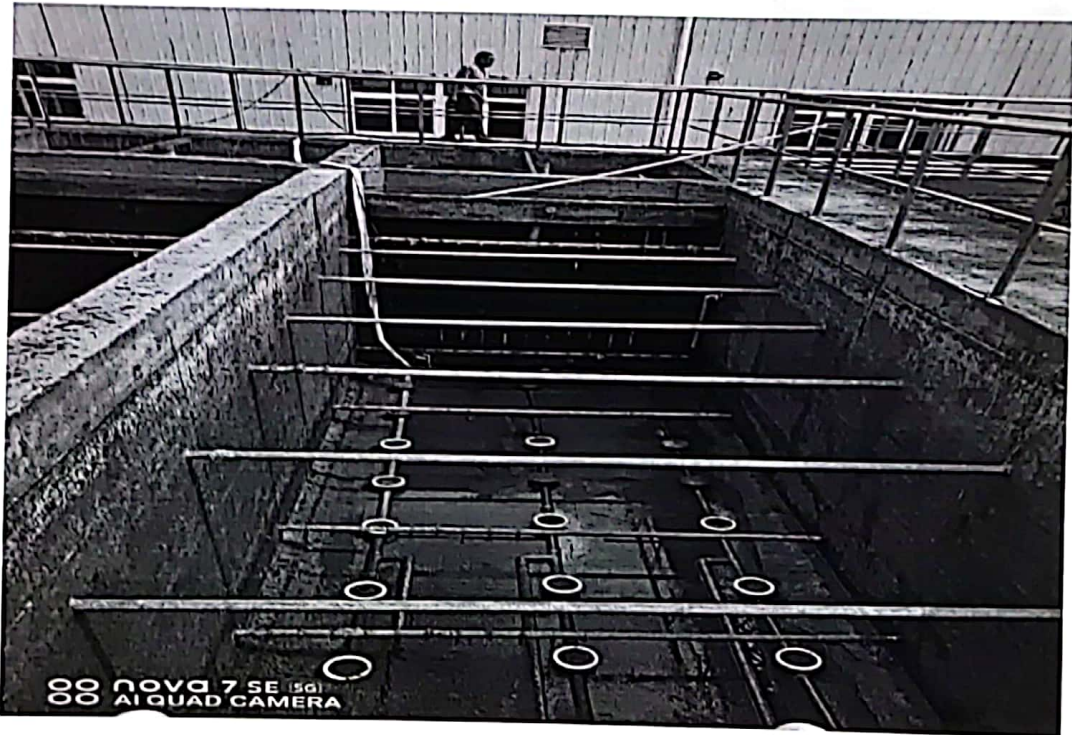

整改前 A/O 池、低负荷池填料拆除，不利培养菌种




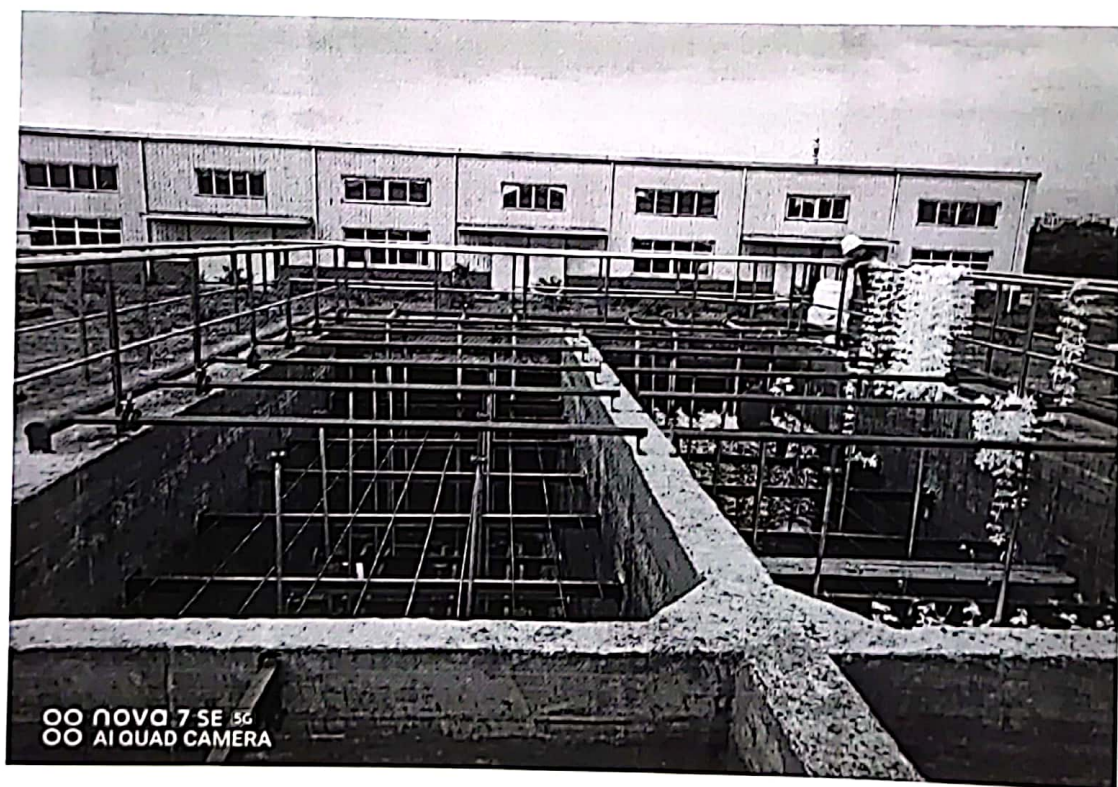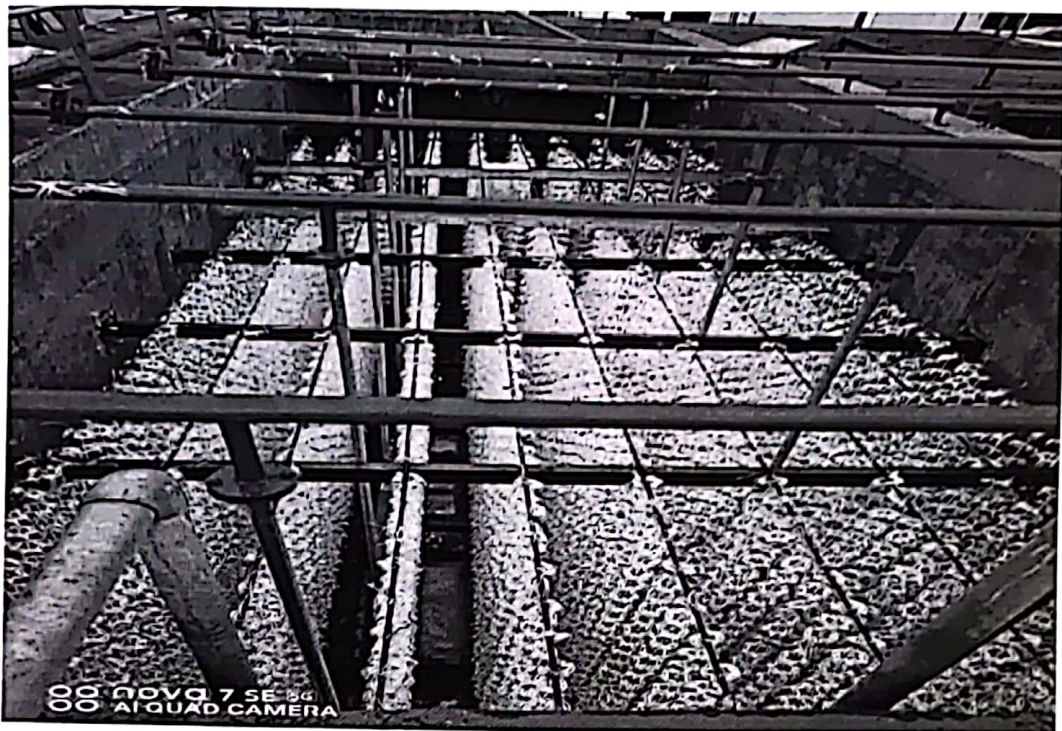

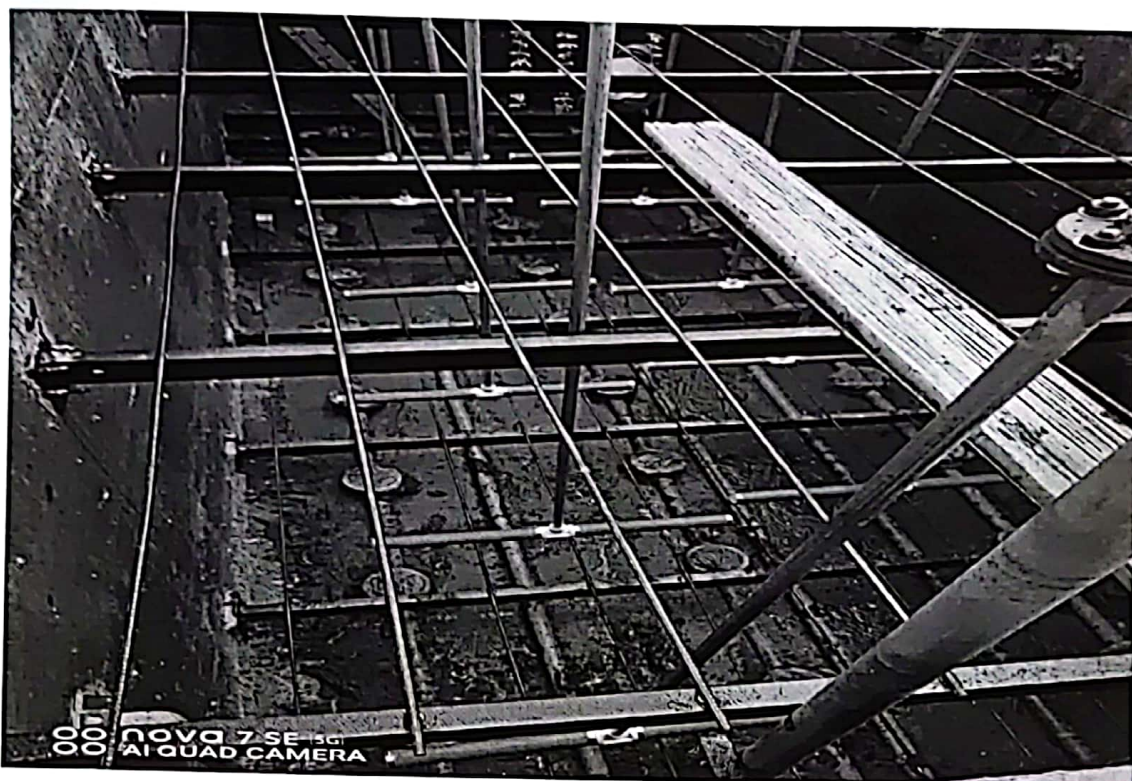

整改后 A/O 池、低负荷池增挂填料、爆气管、盘

2、污泥压滤机改造情况

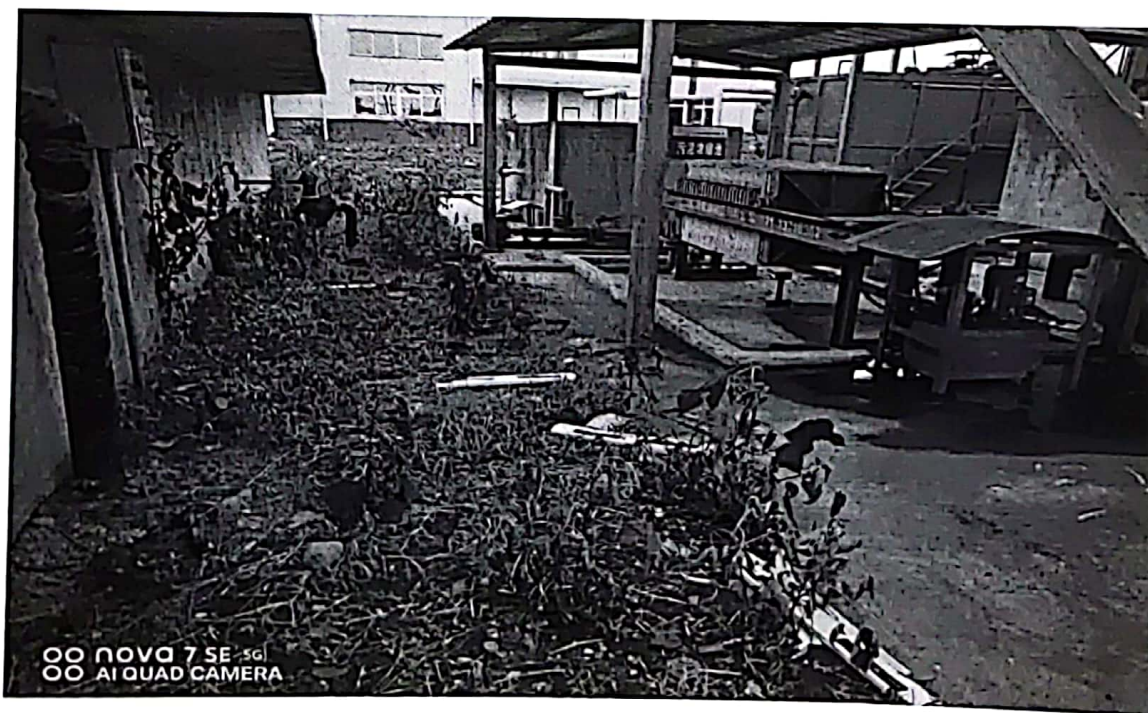

整改前





整改后抬高压滤机，增加压滤机滤液暂存池

3.催化氧化系统改造情况



整改前





整改后：拆除原氧化塔，目前已完成基础施工，待安装设备

4.污泥回流系统改造情况



整改前






整改后增加污泥回流提升泵

二、污水在线监测系统改造情况




整改前



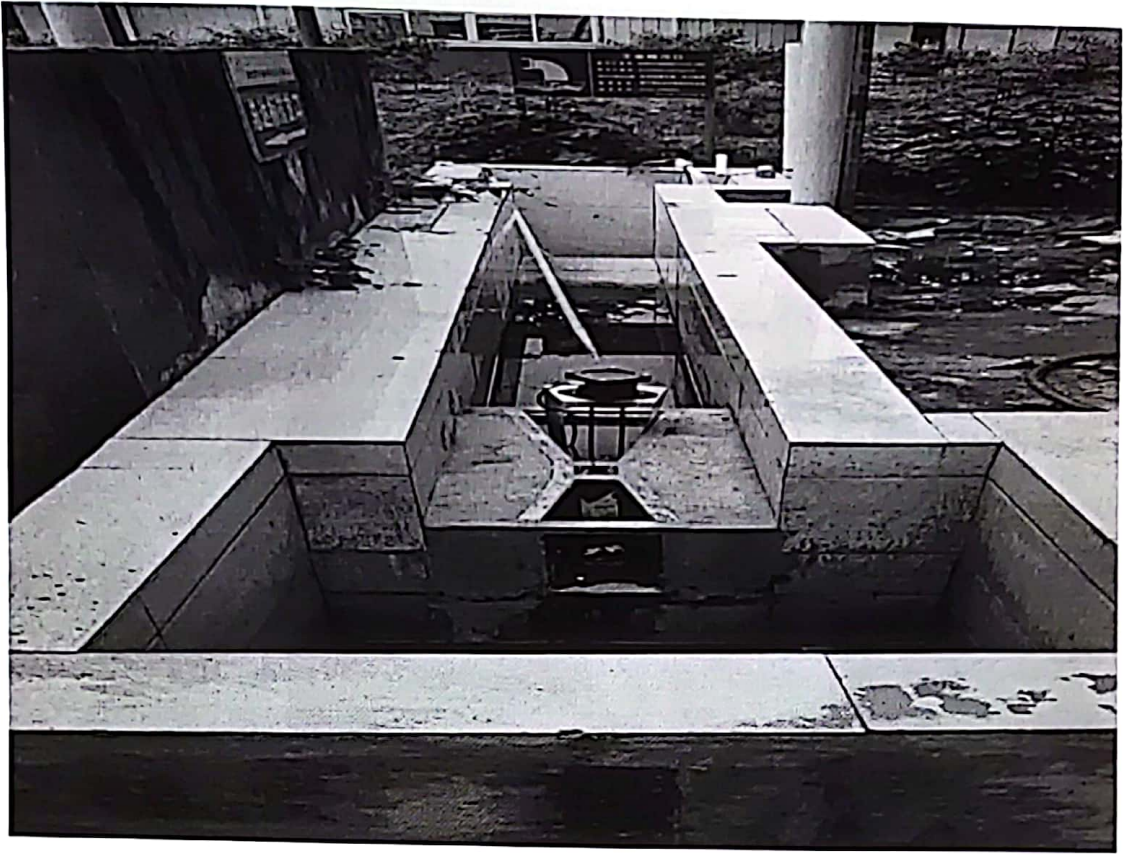

整改后增加巴歇尔槽流量计

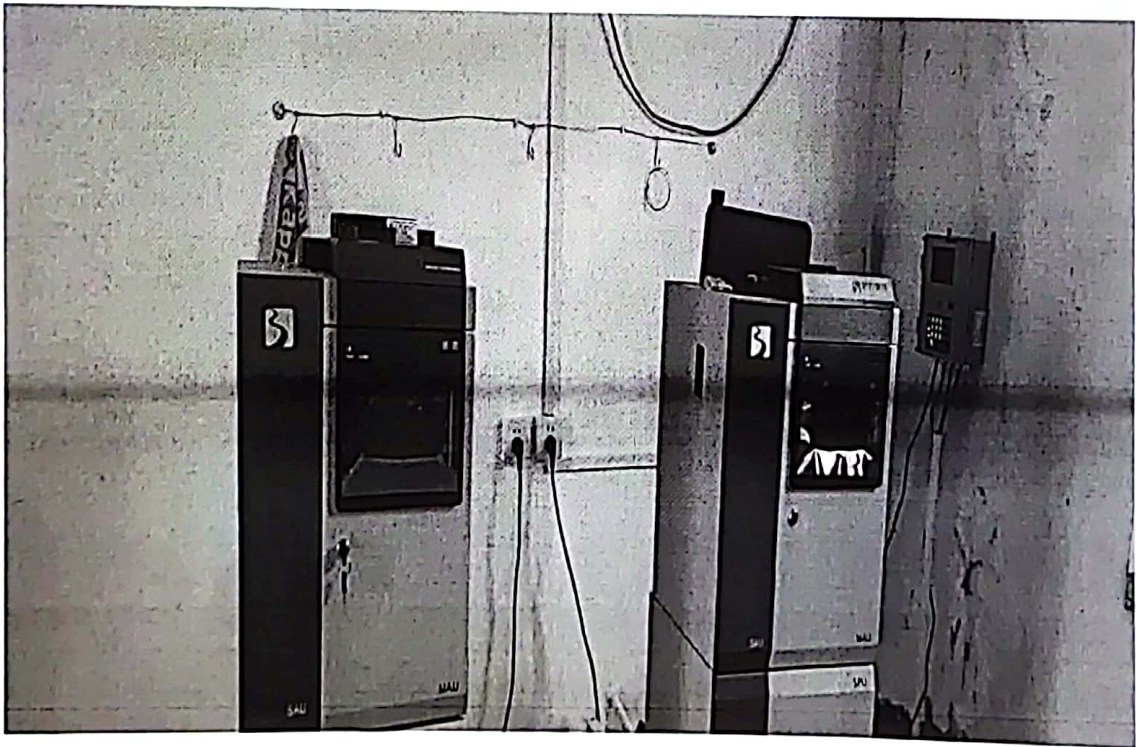

整改后污水在线监测设备安装，待调试

三、其他停工整改佐证资料



污染源在线自动监控系统设备采购

合同书

甲方：荆门华丹医药科技股份有限公司

乙方：湖北万策环保科技有限公司

签订污水在线监测系统服务合同



湖北华丹医药科技股份有限公司
污水处理站改造服务项目

合
同
书

立合同单位：湖北华丹医药科技股份有限公司（简称甲方）

湖北省瑞科环保科技有限公司（简称乙方）

签订日期：

2023年6月1日

依据《中华人民共和国民法典》以及本工程的具体情况，双方经友好协商对于湖北华丹医药科技股份有限公司污水处理站改造服务项目达成共识，双方同意严格遵守以下各项条款，签订本合同。

签订污水处理站改造升级服务合同



代理购电用户账单

管理单位:	钟祥市供电公司	户名:	6646783658	户号:	湖北省荆门市钟祥市供电公司	账单年月:	2024.05			
用电地址:	荆门市钟祥市钟祥镇王家湾444号2栋101号		抄表日期:	2024/05/28	用电性质:	RESIDENTIAL				
总电量:	2878.9	日电量:	207.23	其中增值业务附加费金额:	194.91					
目录电量:	0.03	代理电量:	1884.16	售电电量:	912.32					
力调电量:	-181.80	代理电量:			172.99					
容量:	400	容量:	0	基本电费:	1626.75					
代理购电 (代理购电、代理电度费):	代理购电 (单价): 0.7929 代理电度费: 0.02 大工业电度费 (代理购电 (中央)) 0.0000	代理金额: 879.29 170.38	代理 (单价): 0.0000 代理金额: 0.00	代理金额: 546.95						
电费详情										
执行电价	电表编号	电表的类型	电表上次读数	电表本次读数	综合费率	本月电量	日期	交易	小计电量	电费用电价格
居民电度电价 (含税电度费) 0.7105元	00100020903209	有功 (总)	10262.58	10461.02	0.00	1347.9	05/01	0.0000	0.0000	0.9645
		无功 (尖峰)	0.0	0.0	0.00	0				
		无功 (总)	2015.87	2027.46	0.00	4127				

第1页

执行电价	电表编号	电表的类型	电表上次读数	电表本次读数	综合费率	本月电量	日期	交易	小计电量	电费用电价格	
居民电度电价 (含税电度费) 0.7105元	00100020903209	有功 (总)	2295.78	2330.51	0.00	27.08	05/01	0.0000	0.0000	0.6436	
		无功 (总)	4879.63	4902.25	0.00	541.0					
		尖峰代理电量	-	峰代理电量	-	平代理电量 (单价: 0.3993)	5458.95	谷代理电量	-	代理电量小计	5458.95
		尖峰电度电价	-	峰电度电价	-	平电度电价 (单价: 0.7094)	2943.95	谷电度电价	-	电度电量小计	2943.95
		代理电量:	629.47							小计电量: 19948.37	
		功率因数标准:	不考核	实际功率因数:	0	功率调整金额:	0	力调电量:	0		
大工业电度电价 (含税电度费) 1.0000元	00100025224349	有功 (总)	982.1	1012.12	0.00	1471.0	05/01	0.0000	0.0000	1.0000	
		有功 (尖峰)	49.59	49.98	0.00	195					
		有功 (峰)	429.87	446.65	0.00	979					
		有功 (谷)	156.73	158.3	0.00	185					
		无功 (总)	269.26	274.65	0.00	319					
		尖峰代理电量 (单价: 1.0000)	136.54	峰代理电量 (单价: 0.6796)	5387.67	平代理电量 (单价: 0.3993)	1729.22	谷代理电量 (单价: 0.1967)	146.58	代理电量小计	7262.41

第1页

5月份用电账单

